

# 笹尾山周辺整備基本計画〔概要〕

## 【史跡関ヶ原古戦場整備計画別冊】

笹尾山周辺整備計画の更なる推進を図るため、史跡関ヶ原古戦場整備計画別冊として作成

### 第1章 計画策定の経緯と目的

- 1 計画策定の経緯
- 2 計画の目的
- 3 委員会の設置及び開催の経緯
- 4 計画期間
- 5 計画の対象範囲
- 6 関連計画との関係



### 第2章 計画地の現状

- 1 位置と自然的環境
- 2 笹尾山周辺及びその周辺地域の歴史的環境
- 3 社会的環境 (法規制等を整理)

### 第3章 笹尾山周辺（決戦地及び石田三成陣地）の概要

- 1 史跡等指定の状況
- 2 史跡等の概要
- 3 これまでの史跡整備の取組みと今後の課題
- 4 史跡等公開活用のための諸条件把握

### 第4章 基本理念と基本方針

#### 1 基本理念

- ・ 往時の景観復元・再生と未来への継承
- ・ 観光客と地域住民の交流を通じた史跡の活用

#### 2 基本方針

- ・ 絵葉書となるような往時の地形・景観の復元・再生  
関ヶ原の戦いからこれまでの歴史の積み重ねも考慮の  
うえで、往時に近い環境を目指す  
※関ヶ原合戦図屏風や古写真等を参考
- ・ 観光客及び地域住民による活用
  - ① 歴史に触れることができる学びの場
  - ② 観光客と住民の交流の場
  - ③ 親子で遊びを通じて学べる場

関ヶ原合戦図屏風〔嘉永7（1854）年〕



関ヶ原町俯瞰写真〔昭和12年（1937）頃〕



## 1 ゾーニング計画

エリアごとの関連性を踏まえ、笹尾山、旧北小等にゾーニング、地区別整備方針を設定

地区区分の設定及び地区別整備方針（主なもの）

### 笹尾山ゾーン【A】

- ・石田三成の視点を意識した眺望確保のための樹木伐採
- ・陣幕の整備
- ・馬防柵一部撤去

### 旧北小学校ゾーン【C】

- ・既存校舎撤去、緑あふれる広場の整備
- ・農業用水を活用した学びの仕掛けづくり

### 旧北小学校グラウンドゾーン【B】

- ・水はけの向上を目指した再整備
- ・イベント開催等による積極的活用

### 指定地外ゾーン【F】

- ・笹尾山の歴史を学ぶこと等ができるガイダンス施設の整備
- ・子どもたちが遊べるスペース確保

## 2 保存整備に関する計画

- ・本史跡の本質的価値である眺望の継続的な確保（樹木管理）
- ・必要に応じた試掘、確認調査の実施

## 3 活用整備に関する計画（指定地内）

### 動線計画

- ・来訪者の安全性を確保した自動車動線（B～C間道路の車止め、一部待機場所整備）
- ・歩車分離を図った南北道路の活用

### 地形造成に関する計画

- ・遊びを通じて学べる場の創出に向けた農業用水のアプローチ整備
- ・一部の水路グレーチング（着蓋）

### 史跡の空間表現に関する計画

- ・小学校跡地の緑地化
- ・活用広場の水はけ向上
- ・B～C間道路の景観舗装

### 修景及び植栽に関する計画

- ・眺望確保のための樹木伐採
- ・陣幕復元、馬防柵一部撤去
- ・笹尾山麓無電柱化

### 案内、解説施設に関する計画

- ・適切な史跡解説、誘導案内サイン

### 管理、便益施設に関する計画

- ・既存の四阿活用、ベンチ等の整備

### 環境保全に関する計画

- ・関ヶ原町景観計画の運用開始（R3～）  
（景観計画策定、景観条例制定）

## 4 活用整備に関する計画（指定地外）

- ・笹尾山の歴史を学ぶ場、観光客及び地域住民が活用できるガイダンス施設（ガイダンス機能、甲冑体験、カフェ兼休憩スペース、スタジオなど）
- ・子どもたちが歴史に触れながら、遊べるスペースの確保

## 第6章 管理・運営に関する計画

- 1 公開活用計画
- 2 整備事業に関する庁内体制
- 3 日常的な維持管理、保存、公開に関する運営・体制
- 4 地域住民の参画

活用事例（関ヶ原合戦祭り）



## 第7章 事業計画

### 1 整備の優先順位

- ・合戦時から今日までの経過も踏まえ、往時に近い環境を目指した樹木の伐採、管理
- ・旧北小学校は耐震上の課題も踏まえ、早急な取壊し及び跡地の緑地化

### 2 年次計画

- ・笹尾山周辺整備は、設計から全面供用開始まで最短でも6年を要する見込み
- 2025（令和7）年度：基本設計
- 2026（令和8）～2030（令和12）年度：詳細設計及び整備工事
- 2031（令和13）年度：全面供用開始（史跡指定100周年）

（最短スケジュール）

年度	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	
計画・設計	基本計画	基本設計				整備詳細設計			
エリア整備	笹尾山								
	石田三成陣地					陣幕整備、機追加等			
	全域	先行伐採工事				景観整備	景観整備		
	南面山裾					馬防柵一部撤去等			
	南側丘陵地	イベントステージ(現状維持)							
	多目的エリア	多目的エリア(現状維持)							
	小学校跡地								
	指定地内		校舎解体撤去詳細設計		校舎解体撤去、構造物撤去、伐採工事	活用広場整備・緑化・水路、親水スペース整備			
	指定地外					ガイダンス施設 建築工事	開館準備		
							進入路、駐車場、遊べるスペース整備		
周辺地域									
	コスモス/ひまわり畑(現状維持)								
	ひまわり畑(現状維持)								
道路整備	小学校跡地周辺道路							舗装工事	
	主要アクセス道							歩車分離、景観舗装	
	その他周辺道路							無電柱化検討、整備	
関係者間の調整	旧北小取り壊し								
	保管品移転	保管品の移転に向けた調整		移転					
	笹尾山観光交流館	移転に向けた調整		移転					
	その他								
	さくらんぼの家	移転に向けた調整		移転					
ゲートボール場	移転計画策定		移転						

全面供用開始 ※関ヶ原古戦場国史跡指定100周年

### 3 想定事業費


- ・事業費は10億円程度と試算（旧北小学校撤去費除く）
- ・町の厳しい財政状況を勘案し、可能な限りコスト縮減、財政負担の平準化

### 4 完成予想図、平面図含む

完成予想図



完成予想平面図

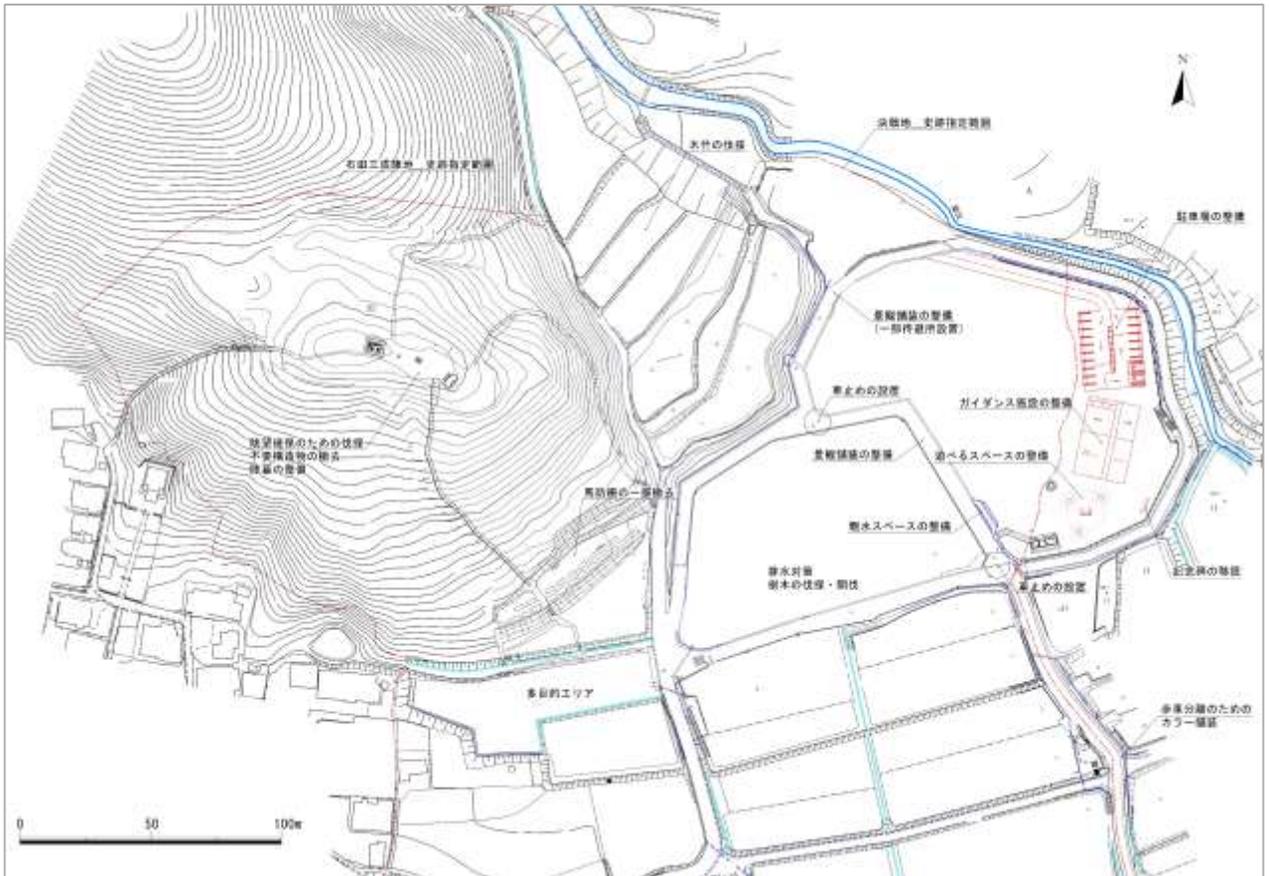

## 笹尾山周辺整備後のイメージ②

町道決戦地線の舗装イメージ図



親水スペースの整備イメージ図



旧北小学校及びグラウンドの整備イメージ図



陣幕整備後のイメージ図



指定地外の整備イメージ図



### 【問い合わせ先】

関ヶ原町古戦場活用推進課

岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原894-58

【TEL】 0584-43-1111(代)

【H P】 <https://www.town.sekigahara.gifu.jp/>
